

Verbale dell'incontro del 31 Luglio 2024

Il giorno 31 Luglio su convocazione della Direttrice Generale si riuniscono:

1. **Avv. Mario Parlavecchio** (*Responsabile della Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità*)
2. **Ing. Giovanni Romano** (*collaboratore tecnico ingegnere dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo*)
3. **Geom. Giuseppe Antonino Liberti** (*RUP intervento 13.01.05*)

Partecipano altresì alla riunione, poiché direttamente invitati dai convocati:

1. **Ing. Giovanni Cardillo** (*Consulente esterno in impianti della Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della rete Ospedaliera*)
2. **Ing. Luisa Marino** (*Direttore dei Lavori del 1° stralcio, intervento 13.01.05*)
3. **Ing. Marco Ciulla** (*Direttore Operativo strutture e impianti del contratto principale 1° stralcio- Direttore dei Lavori e CSE del contratto in appendice al contratto principale 2° stralcio -intervento 13.01.05*)
4. **Geom. Felice Angelastri** (*per conto dell'Operatore Economico Appaltatrice CONPAT s.c.a.r.l., giusta delega del 31/07/2024 allegata*)

La riunione indicata dall'avv. Parlavecchio per approfondire lo stato dell'arte e le procedure relative alla conclusione degli interventi relativi al Piano di Potenziamento Regionale della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana di cui al Decreto Assessoriale n. 1014 del 06/10/2021" ha avuto come oggetto l'analisi dello stato di avanzamento di quanto sopra richiamato.

Gli interventi riguardano:

- Codice S.A. 13.01.01 (Lavori per il completamento delle opere civili e impiantistiche - Chirurgia D'Urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di Terapia Intensiva);
- Codice S.A. 13.01.02 (Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche - Chirurgia con posti di Terapia Sub-Intensiva), Lavori Per Il Completamento Delle Opere Civili Ed Impiantistiche - Interventi Per Il Completamento Del Plesso Nuova Area Di Emergenza;
- Codice S.A. 13.01.05 - Progetto definitivo degli interventi di completamento della Centrale Tecnologica e del tunnel e P.S. a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S.

Richiamate le nostre note di riscontro alle richieste dell'Assessorato Regionale della Salute, prot. n. 41153 del 16/07/2024 e prot. 43980 del 31/07/2024, i tecnici dell'azienda rappresentano le criticità legate al completamento degli interventi di cui sopra e in particolare quelle riferite al completamento degli impianti e delle centrali dei gas medicali/medicinali.

In risposta, la ditta Compact, rappresentata dal Geom. Angelastri, dichiara la piena disponibilità a provvedere, entro e non oltre 15/09/2024, agli adeguamenti necessari degli impianti e delle centrali e a produrre la certificazione a norma di legge degli A/C Med. realizzata in seno ai lavori dell'intervento 13.01.02.

In merito, la Direzione Generale richiederà una relazione alla Persona Autorizzata dei gas medicinali dell'AOUP Paolo Giaccone, aggiornata e ad integrazione di quelle ricevute precedentemente; e successivamente a comunicare alla Struttura Tecnica di Supporto e alla ditta Compact, i lavori necessari da realizzare per l'adeguamento degli impianti e delle centrali dei gas medicali/medicinali, affinché vengano rilasciate tutte le certificazioni necessarie per procedere al collaudo definitivo.

Inoltre, si fa presente che l'AOUP, con nota prot. 41153 del 16/07/2024 indirizzata all'Assessorato Regionale della Salute (*nota prot. 32077 del 05.07.2024 Richiesta Informazioni in riferimento al Decreto Assessoriale 1014 del 06/01/2021-riscontro*), ha evidenziato la necessità di un nuovo fabbisogno finanziario per il completamento dell'intervento 13.01.05.

L'Avv. Parlavecchio, fa presente che il suddetto completamento, oggi soggetto a variante, è complementare alla definizione degli interventi 13.01.01 e 13.01.02.

Infine, lo stesso Avv. Parlavecchio, ribadisce che a seguito della deliberazione di giunta n. 416 del 2023, la Regione si è impegnata a coprire con fondi regionali eventuali incrementi discostanti dal quadro economico iniziale.

Letto e condiviso

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Avv. Mario Parlavecchio

Ing. Giovanni Romano

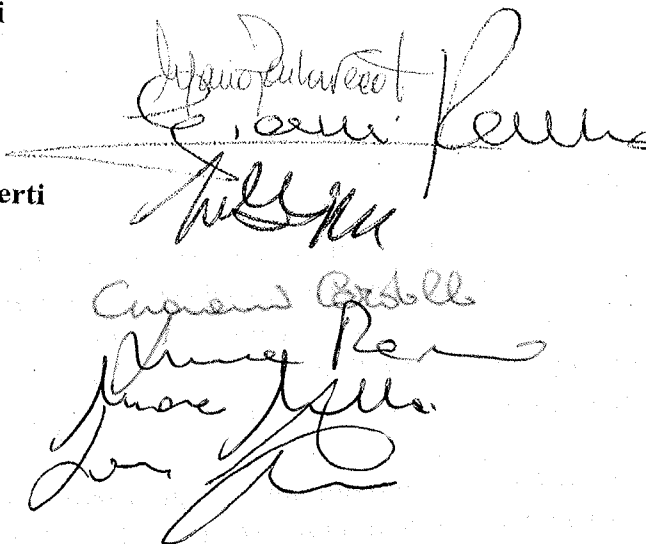
Geom. Giuseppe Antonino Liberti

Ing. Giovanni Cardillo

Ing. Luisa Marino

Ing. Marco Ciulla

Geom. Felice Angelastri

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top, there is a signature that appears to be 'Mario Parlavecchio'. Below it, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to read, but they correspond to the names listed in the adjacent column. The signatures are written over a horizontal line.



Q fangelastri@gedigroupspa.it



994

Scrivi



Mail

Posta in arrivo 3.963

Chat

Speciali

Posticipati

Meet

Inviati

Bozze 2

Altro

Etichette

giuseppe.liberti

Sent-10-2017

Altro

Verbale dell'incontro del 31 Luglio

External Posta in arrivo x

FELICE ANGELASTRI <fangelastri@gedigroupspa.it>

a direzione.generale@policlinico.pa.it, me

Buon pomeriggio come da oggetto invio Verbale da me sottoscritto, distinti saluti

**Geom. Felice Angelastri***Responsabile Tecnico*

Sede legale e amministrativa:

Via Monte Rosa n°25

70022 Altamura (Ba)

Piva: 08406920721

SDI: W7YVJK9

Tel 080 316.30.10 - fax 080 314.99.80

Mobile: +39.3334471091

Email: fangelastri@gedigroupspa.it

RISERVATEZZA & PRIVACY. Le informazioni e/o file allegati contenuti nella presente email, sono riservate e confidenziali. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679- GDPR e al momento potrete richiederci l'informativa per la privacy o esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento). In caso di richiesta di questa natura, si prega di indicare il destinatario. Vi preghiamo cortemente di darne corso e di procedere al

Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra



